
Nr.	Bezeichnung	Dau. gepl.	Beginn gepl.	E gepl.
01	**Vorbereitende Maßnahmen**	**704**	**22.03.04**	**24.02.06**
02	**Parkplatz**	**270**	**22.03.04**	**17.12.04**
03	- Klärung mit Eigentümer	48	22.03.04	09.05.04
04	- Finanzierung	0	14.05.04	14.05.04
05*	- Genehmigungsplanung	35	18.05.04	22.06.04
06	- Genehmigung	0	29.07.04	29.07.04
07*	- Ausführungsplanung und Herstellen	137	02.08.04	17.12.04
08	**Maßnahmen Museum Industriekultur**			
09	- Errichtung Ausstellungszelt	5	13.09.04	18.09.04
10	- Ausstellung "Terrakotta"	160	18.09.04	25.02.05
11	- Beginn Bayerische Landesausstellung	0	24.02.06	24.02.06
12	**Umbaumaßnahmen**	**580**	**23.07.04**	**23.02.06**
13	Planung			
14	- Mittelbereitstellung	0	23.07.04	23.07.04
15*	- Planung (bis Lph 4)	53	02.08.04	24.09.04
16	- Genehmigung BRL	0	26.10.04	26.10.04
17	- Lph 5 bis 7 (Werkplanung und Vergabe)	95	01.11.04	04.02.05
18	Durchführung			
19	- Baubeginn	0	28.02.05	28.02.05
20	- Abbruch Toilettenanlage	12	28.02.05	12.03.05
21	- Umbau Fluchttreppe und Aggregate	60	28.02.05	29.04.05
22*	- Errichtung Eingangsgebäude und Toiletten	319	14.03.05	27.01.06
23	- Errichtung Kulissenaufzug	137	14.03.05	29.07.05
24	- Eingang Centrum Industriekultur	38	22.12.05	29.01.06
25	- Baufertigstellung	0	23.02.06	23.02.06

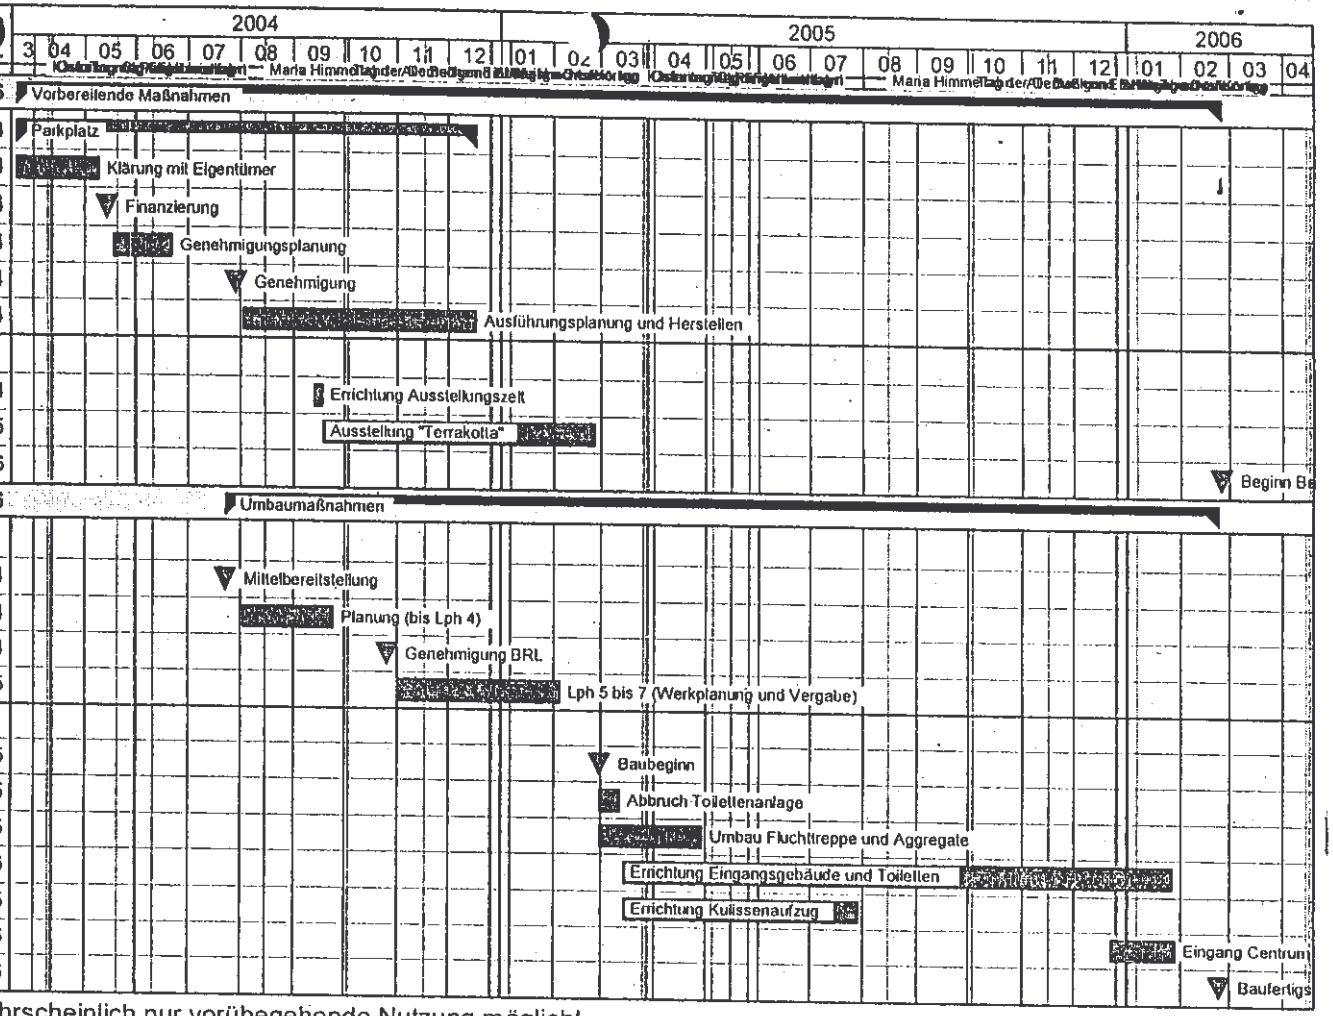

05 Planung widerspricht dem rechtskräftigen Bebauungsplan - wahrscheinlich nur vorübegehende Nutzung möglich!

07 Umfasst die Ertüchtigung der Deinstraße und das Herstellen der Parkplätze mit Zufahrtstraße. Problem: Zelt für Ausstellung Terrakotta befindet sich für die vorgesehene Bauzeit auf der Fläche.

15 Einschl. Vorplanung und Abstimmung mit Th, KuF, KuM, Ref VIII!

22 Einschließlich umbau in der Tafelhalle (Künstler-Garderoben u.s.w.).

Anlage 1
