© By IDAT-GmbH 1995 - 2010 V 4.07 21031

Prüfungs-Nr. : 71045
Bauvorhaben : Klinikum Nürnberg Süd

Ausgeführt durch : H. Swoboda
am : 13.03.2012
Bemerkung :

Bestimmung der Korngrößenverteilung

Naß-/Trockensiebung

nach DIN 18123


Entnahmestelle : B 1

Entnahmetiefe : 1,50-1,80 m unter GOK
Bodenart : S, u'
gelbbraun
Art der Entnahme :
Entnahme am : Probe-Nr. :

Laborzentrum Bau Geotechniklabor

Bestimmung der Korngrößenverteilung
Naß-/Trockensiebung
nach DIN 18123

Projekt : Klinikum Nürnberg Süd; SAP9460419
Auftrags-Nr.: BBV1213608 Anlage : 8

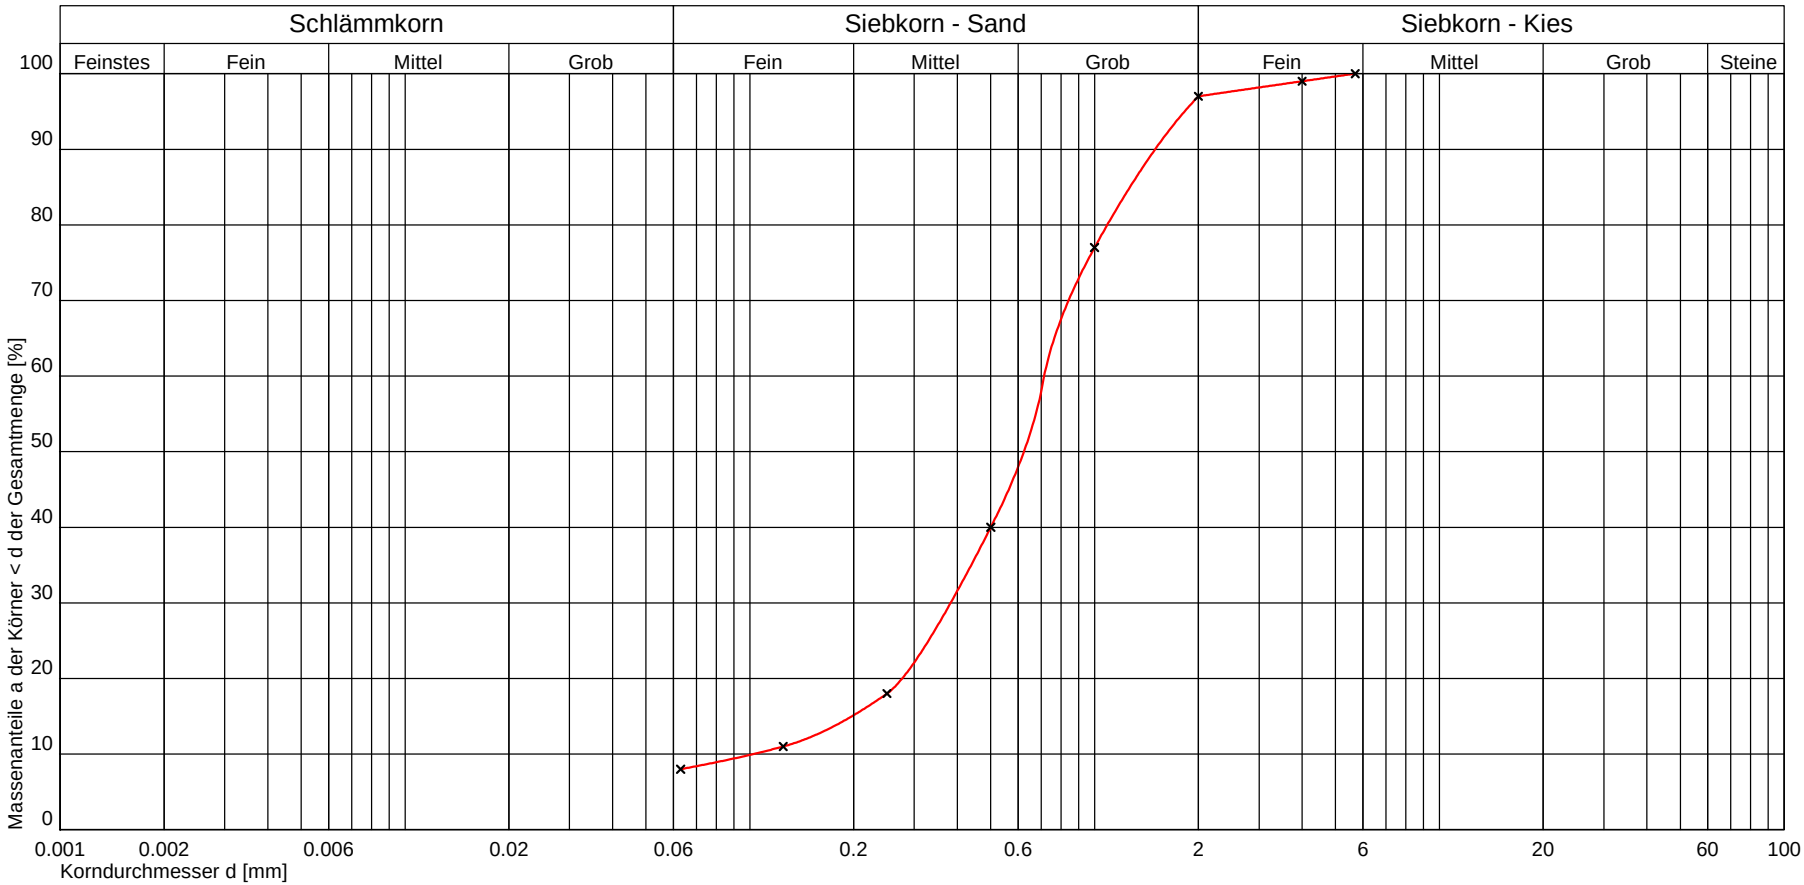

Kurve Nr.:			
Arbeitsweise	Siebung nach nassem Abtrennen		
U = d60/d10 / C_C	6,97 2,00		
Bodengruppe (DIN 18196)	SU		
Geologische Bezeichnung			
kf-Wert	$8{,}481 * 10^{-5}$ [m/s] nach Beyer		
Kornkennziffer:	0 1 9 0 0 S, u'		

Bemerkungen

kantig - gerundet

TÜVRheinland LGA

© By IDAT-GmbH 1995 - 2010 V 4.07 21031

Prüfungs-Nr. : 71259
Bauvorhaben : Klinikum Nürnberg Süd

Ausgeführt durch : Fr. Treiber
am : 23.03.2012
Bemerkung :

Bestimmung der Korngrößenverteilung

Naß-/Trockensiebung

nach DIN 18123


Entnahmestelle : B 2

Entnahmetiefe : 1,00 m unter GOK
Bodenart : S, u'
rotbraun
Art der Entnahme :
Entnahme am : Probe-Nr. :

Laborzentrum Bau Geotechniklabor

Bestimmung der Korngrößenverteilung
Naß-/Trockensiebung
nach DIN 18123

Projekt : Klinikum Nürnberg Süd; SAP9460419
Auftrags-Nr.: BBV1213608
Anlage : 8

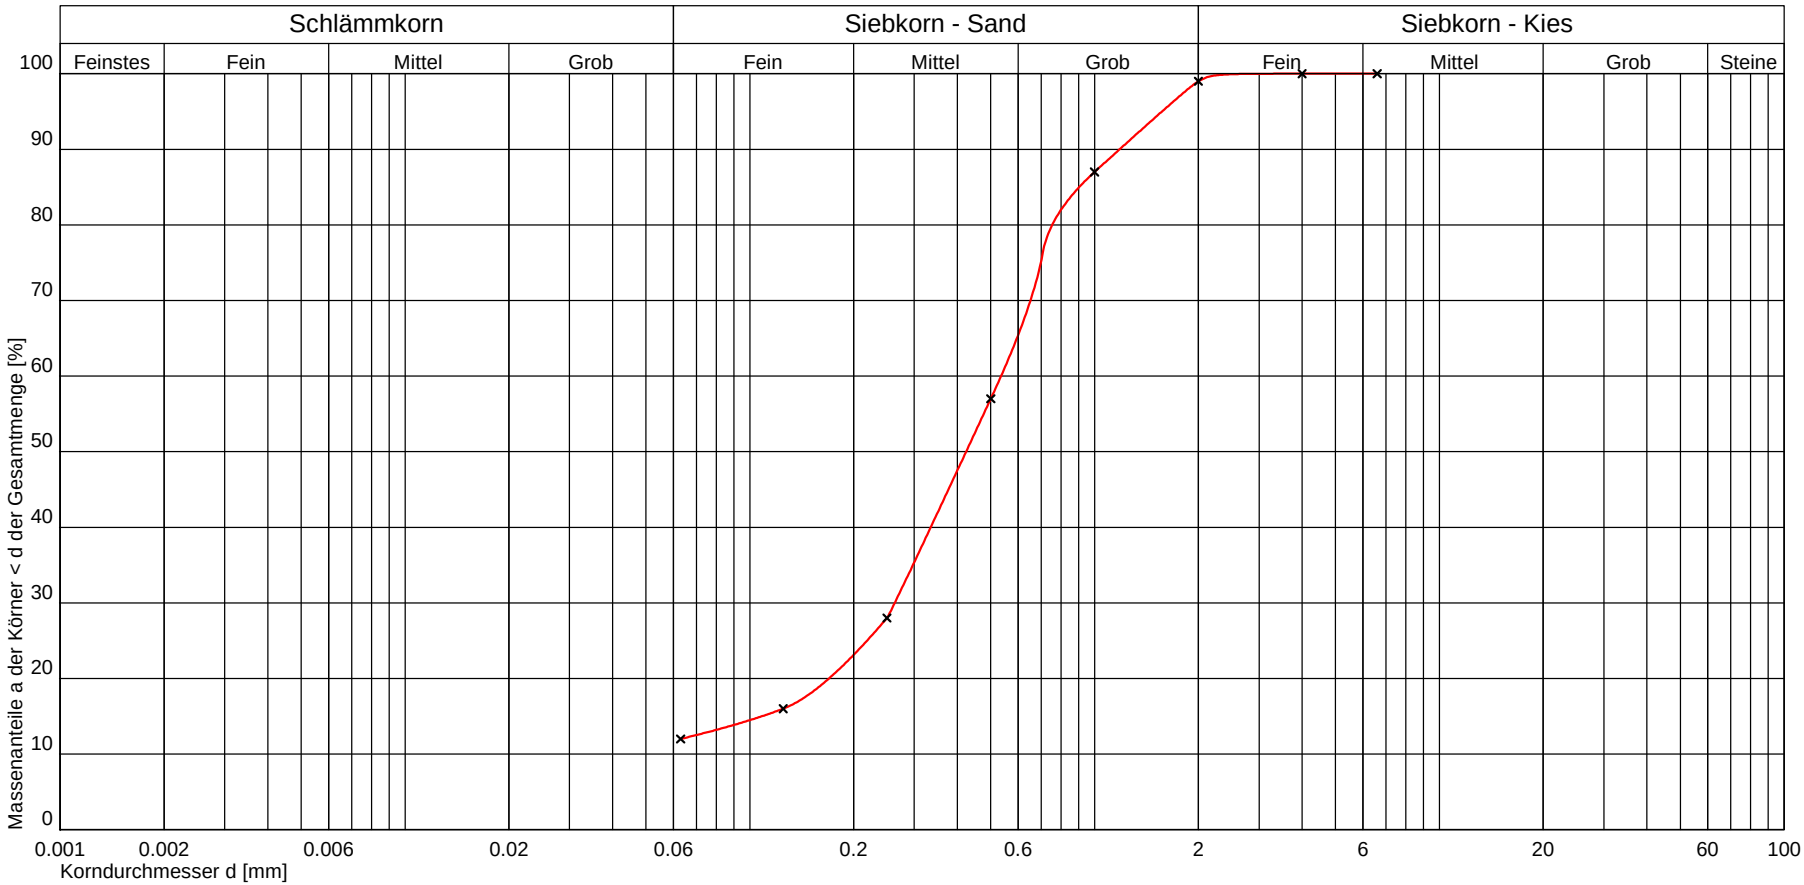

Kurve Nr.:			
Arbeitsweise	Siebung nach nassem Abtrennen		
U = d60/d10 / C_C			
Bodengruppe (DIN 18196)	SU		
Geologische Bezeichnung			
kf-Wert	6,420 * 10^{-4} [m/s] nach Seelheim		
Kornkennziffer:	0 1 9 0 0 S, u'		

Bemerkungen

rundkantig

TÜVRheinland LGA

© By IDAT-GmbH 1995 - 2010 V 4.07 21031

Prüfungs-Nr. : 71047
Bauvorhaben : Klinikum Nürnberg Süd

Ausgeführt durch : H. Swoboda
am : 13.03.2012
Bemerkung :

Bestimmung der Korngrößenverteilung

Naß-/Trockensiebung

nach DIN 18123


Entnahmestelle : B 4

Entnahmetiefe : 1,10-1,70 m unter GOK
Bodenart : S, u'
braun
Art der Entnahme :
Entnahme am : Probe-Nr. :

Laborzentrum Bau Geotechniklabor

Bestimmung der Korngrößenverteilung
Naß-/Trockensiebung
nach DIN 18123

Projekt : Klinikum Nürnberg Süd; SAP9460419
Auftrags-Nr.: BBV1213608 Anlage : 8

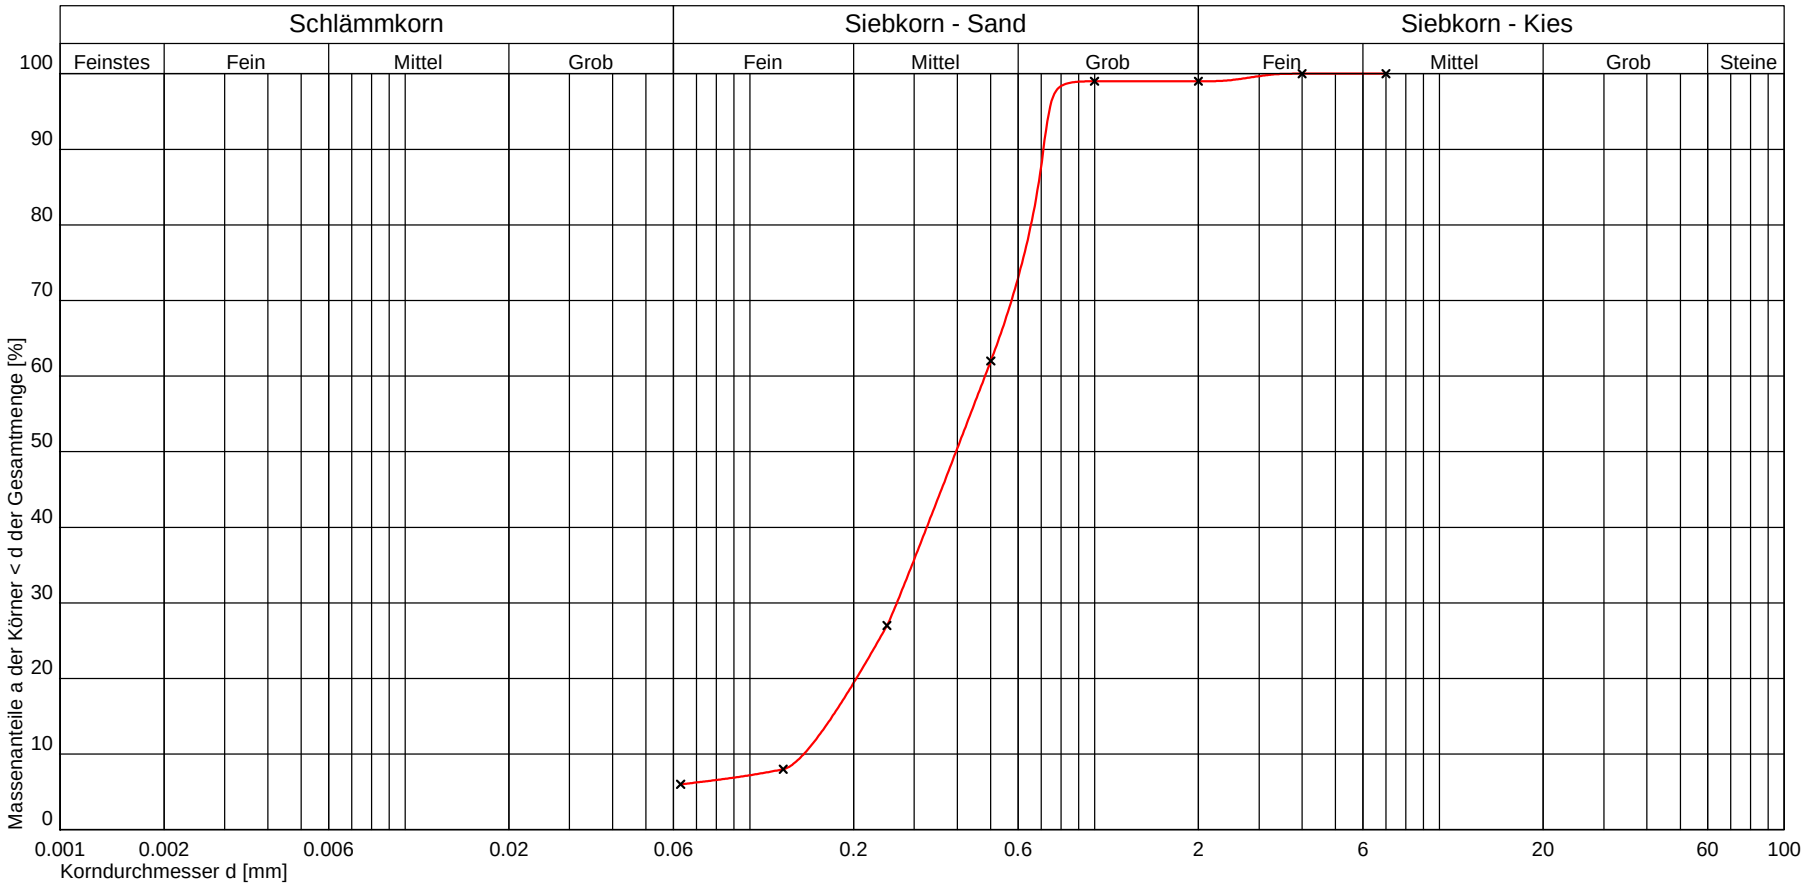

Kurve Nr.:			
Arbeitsweise	Siebung nach nassem Abtrennen		
U = d60/d10 / C_C	3,35 1,03		
Bodengruppe (DIN 18196)	SU		
Geologische Bezeichnung			
kf-Wert	$1{,}947 * 10^{-4}$ [m/s] nach Beyer		
Kornkennziffer:	0 1 9 0 0 S, u'		

Bemerkungen

kantig - gerundet

TÜVRheinland LGA

© By IDAT-GmbH 1995 - 2010 V 4.07 21031

Prüfungs-Nr. : 71048
Bauvorhaben : Klinikum Nürnberg Süd

Ausgeführt durch : H. Swoboda
am : 13.03.2012
Bemerkung :

Bestimmung der Korngrößenverteilung

Naß-/Trockensiebung

nach DIN 18123


Entnahmestelle : B 4

Entnahmetiefe : 2,00-3,00 m unter GOK
Bodenart : S, u'
gelbbraun
Art der Entnahme :
Entnahme am : Probe-Nr. :

Laborzentrum Bau Geotechniklabor

Bestimmung der Korngrößenverteilung
Naß-/Trockensiebung
nach DIN 18123

Projekt : Klinikum Nürnberg Süd; SAP9460419
Auftrags-Nr.: BBV1213608 Anlage : 8

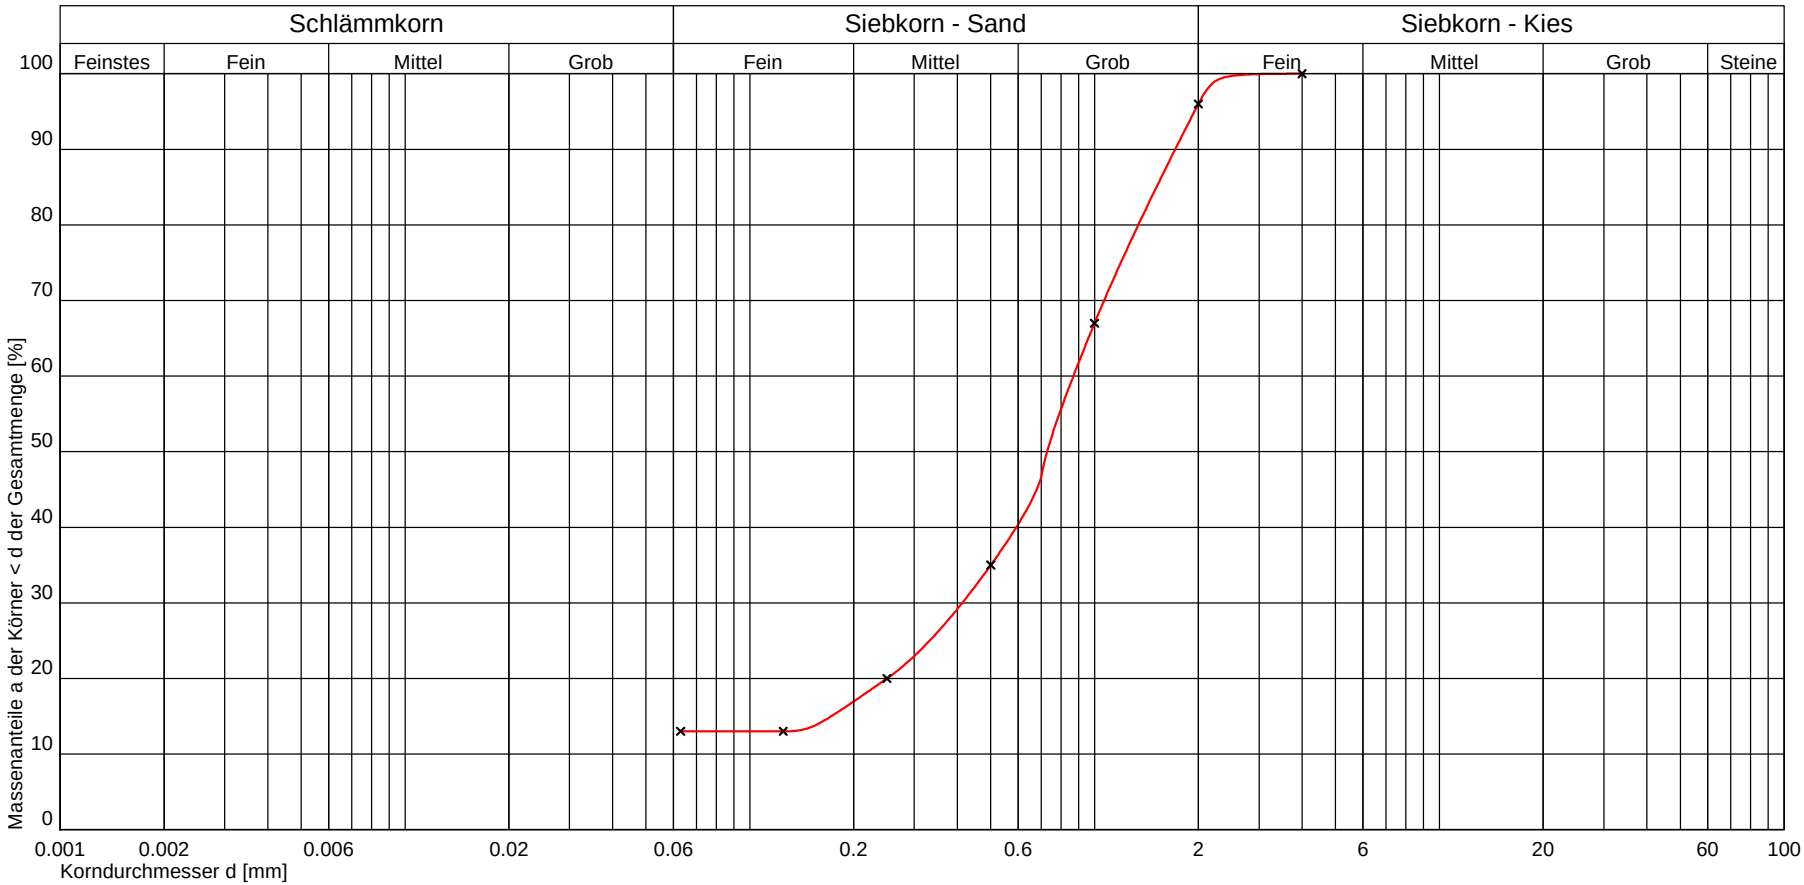

Kurve Nr.:			
Arbeitsweise	Siebung nach nassem Abtrennen		
U = d60/d10 / C_C			
Bodengruppe (DIN 18196)	SU		
Geologische Bezeichnung			
kf-Wert	1,894 * 10^{-3} [m/s] nach Seelheim		
Kornkennziffer:	0 1 8 1 0 S, u'		

Bemerkungen

kantig - gerundet

TÜVRheinland LGA

© By IDAT-GmbH 1995 - 2010 V 4.07 21031

Prüfungs-Nr. : 71049
Bauvorhaben : Klinikum Nürnberg Süd

Ausgeführt durch : H. Swoboda
am : 13.03.2012
Bemerkung :

Bestimmung der Korngrößenverteilung


Naß-/Trockensiebung

nach DIN 18123

Entnahmestelle : B 4

Entnahmetiefe : 3,30-3,90 m unter GOK
Bodenart : S, u
rotbraun
Art der Entnahme :
Entnahme am : Probe-Nr. :

Laborzentrum Bau Geotechniklabor

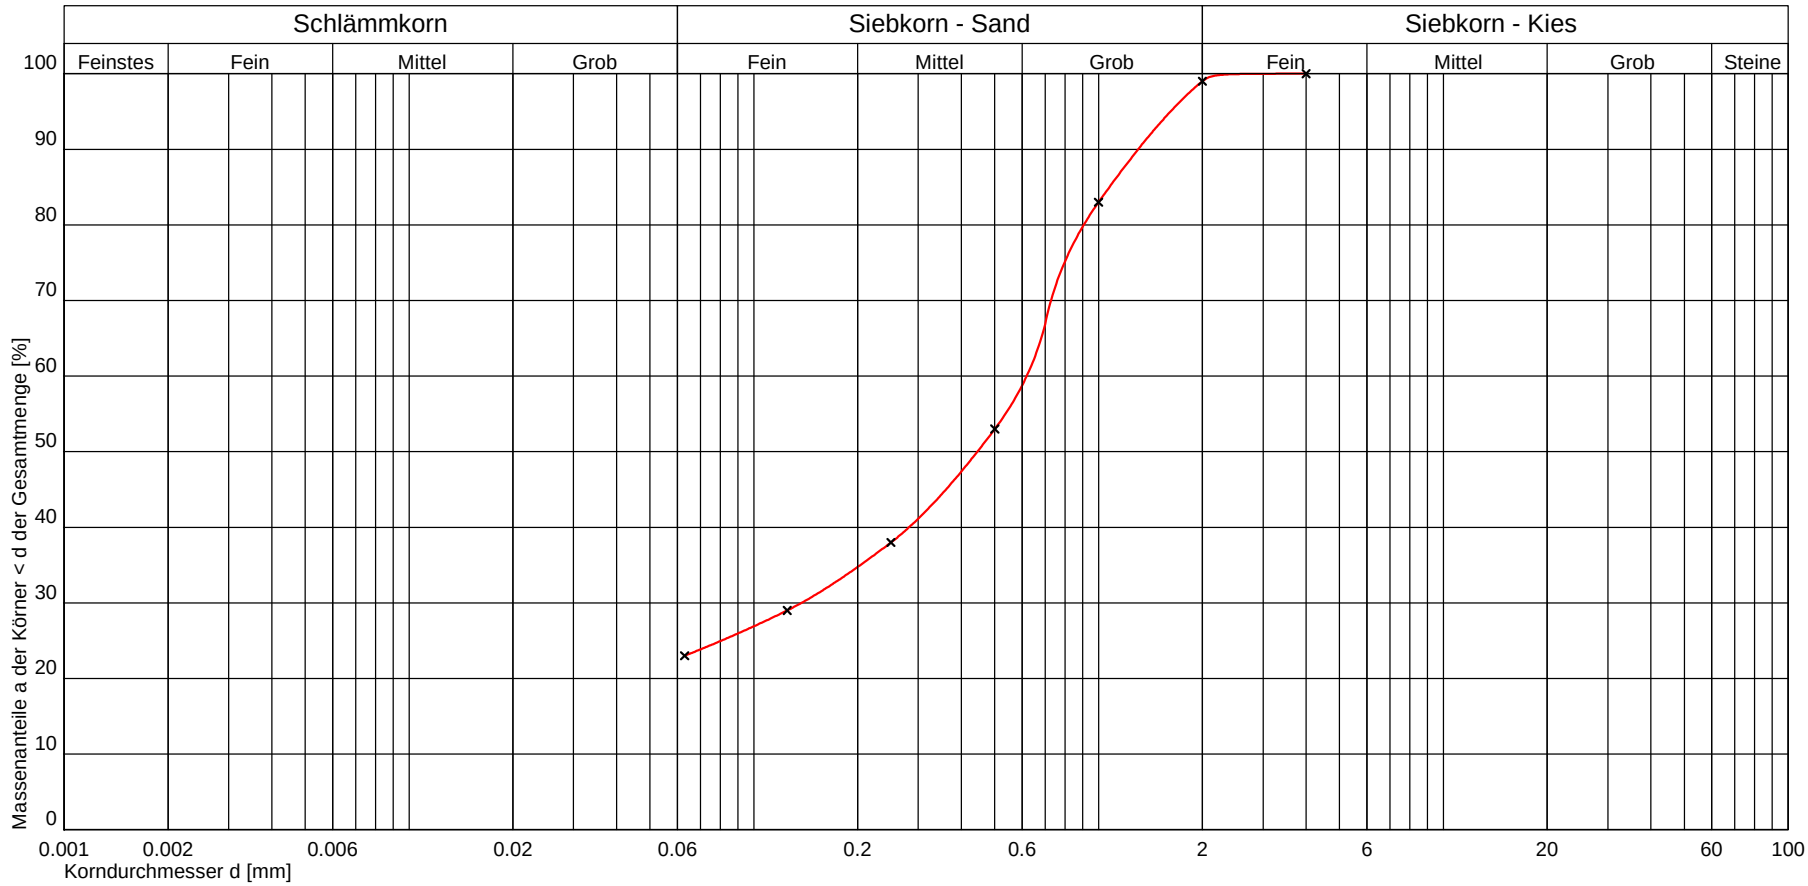

Projekt : Klinikum Nürnberg Süd; SAP9460419
Auftrags-Nr.: BBV1213608 Anlage : 8

Bestimmung der Korngrößenverteilung
Naß-/Trockensiebung
nach DIN 18123

Kurve Nr.:			
Arbeitsweise	Siebung nach nassem Abtrennen		
U = d60/d10 / C_C			
Bodengruppe (DIN 18196)	SU*		
Geologische Bezeichnung			
kf-Wert	7,075 * 10^{-4} [m/s] nach Seelheim		
Kornkennziffer:	0 2 8 0 0 S, u		

Bemerkungen

kantig - gerundet

TÜVRheinland LGA

© By IDAT-GmbH 1995 - 2010 V 4.07 21031

Prüfungs-Nr. : 71050
Bauvorhaben : Klinikum Nürnberg Süd

Ausgeführt durch : H. Swoboda
am : 13.03.2012
Bemerkung :

Bestimmung der Korngrößenverteilung

Naß-/Trockensiebung

nach DIN 18123


Entnahmestelle : B 6

Entnahmetiefe : 0,90 m unter GOK
Bodenart : S, u'
grau
Art der Entnahme :
Entnahme am : Probe-Nr. :

Laborzentrum Bau Geotechniklabor

Bestimmung der Korngrößenverteilung
Naß-/Trockensiebung
nach DIN 18123

Projekt : Klinikum Nürnberg Süd; SAP9460419
Auftrags-Nr.: BBV1213608 Anlage : 8

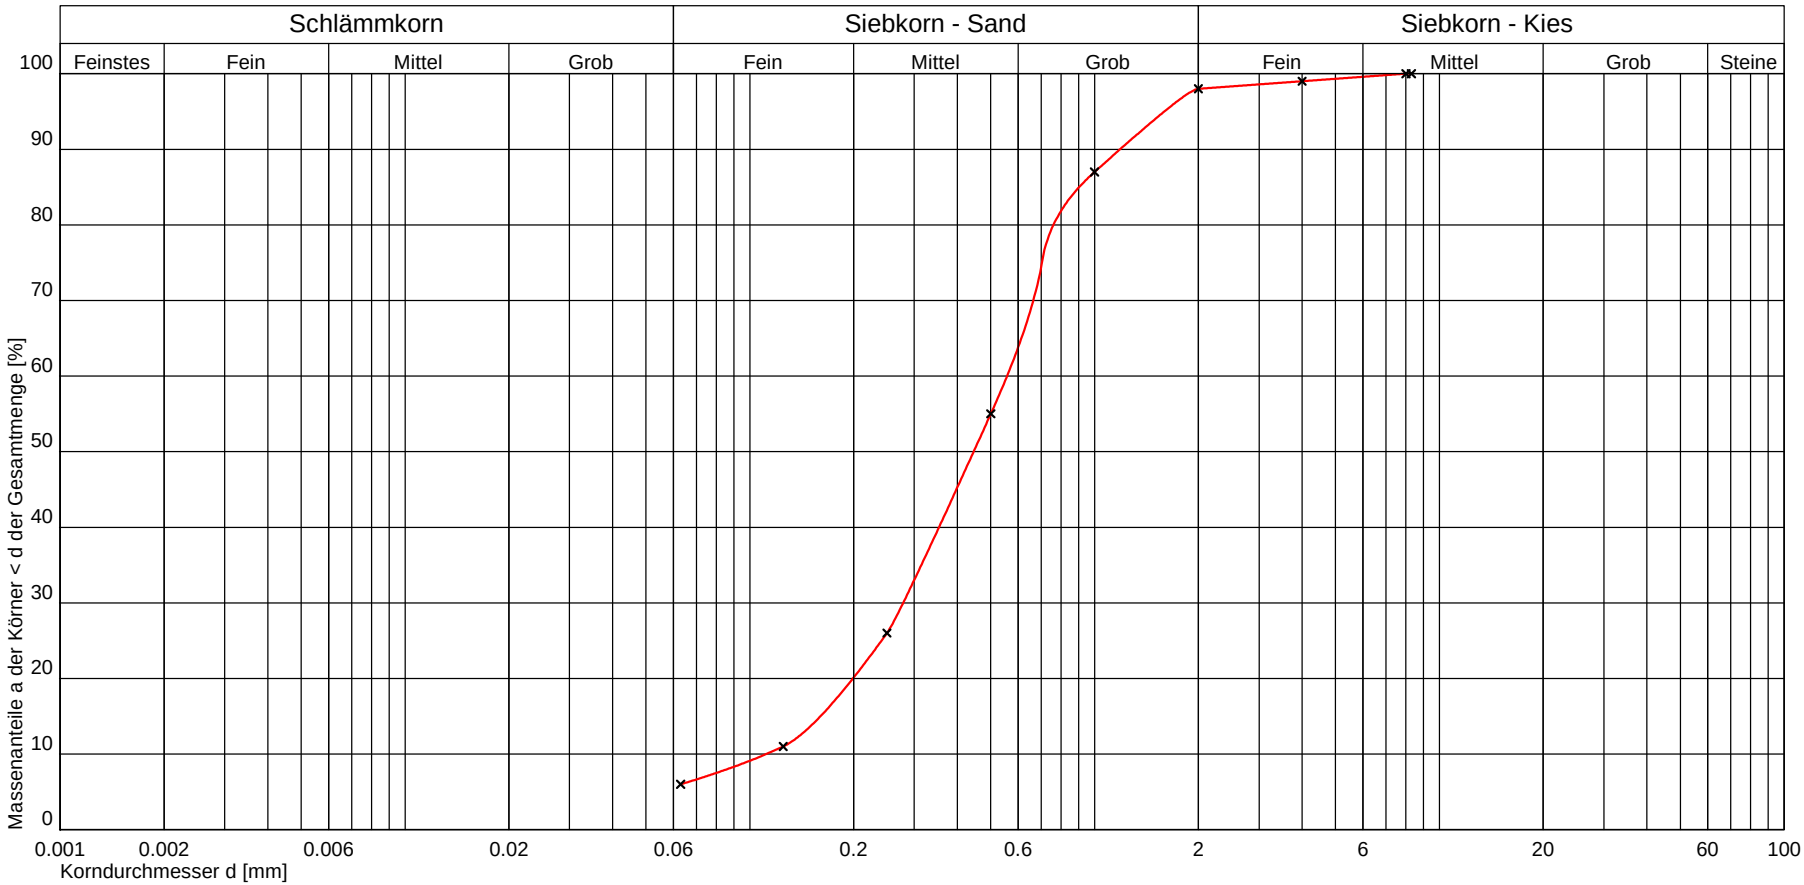

Kurve Nr.:			
Arbeitsweise	Siebung nach nassem Abtrennen		
U = d60/d10 / C_C	4,99 1,25		
Bodengruppe (DIN 18196)	SU		
Geologische Bezeichnung			
kf-Wert	$1{,}084 * 10^{-4}$ [m/s] nach Beyer		
Kornkennziffer:	0 1 9 0 0 S, u'		

Bemerkungen

kantig - gerundet

TÜVRheinland LGA
